



ZMD SFR_JUVISY SUR ORGE
ETAT D'AVANCEMENT
Quartier Plateau


PROJET FTTH
LONG Channara
Philippe MASSELIS

JUVISY SUR ORGE_ZMD : informations


- Nombre de prises totale sur Juvisy sur Orge : » **9 500**
- Rattaché au NRO de Juvisy sur Orge :
- NRO Juvisy sur Orge : 8 rue Jules Ferry
- Etat : Phase finale
- Ouverture du NRO prévisionnelle : S11_2017
- Nombre de Point de Mutualisation : 23 sur l'ensemble de la ville
- Prévisionnel de Déploiement :
 - Pose des armoires : 1^{er} semestre 2017
 - L'ensemble des Armoires sont posées
 - Dont **7** sur le quartier Plateau
 - Déploiement NRO _ PM : Boucle de Collecte : en cours de finalisation S10_2017
 - Déploiement de la Zone arrière :
 - Terminé sur l'ensemble des PM, soit 2 545 prises

L'étude et le déploiement en aérien prendra la suite dès la finalisation du réseau souterrain.


JUVISY SUR ORGE_ZMD : architecture

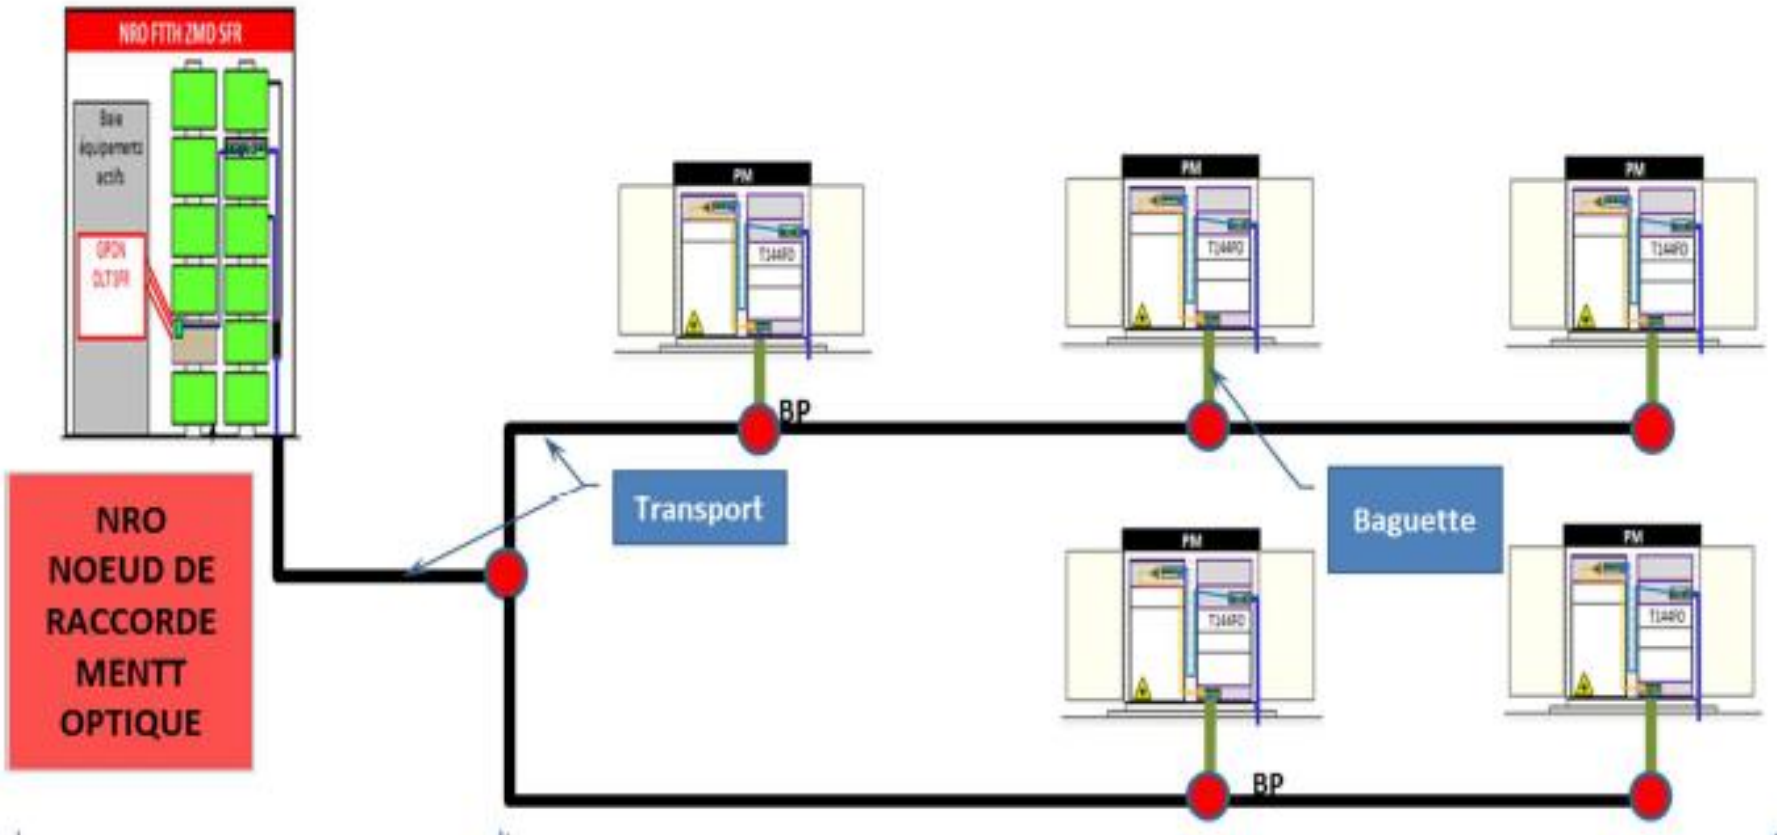


JUVISY SUR ORGE_ZMD : architecture du NRO

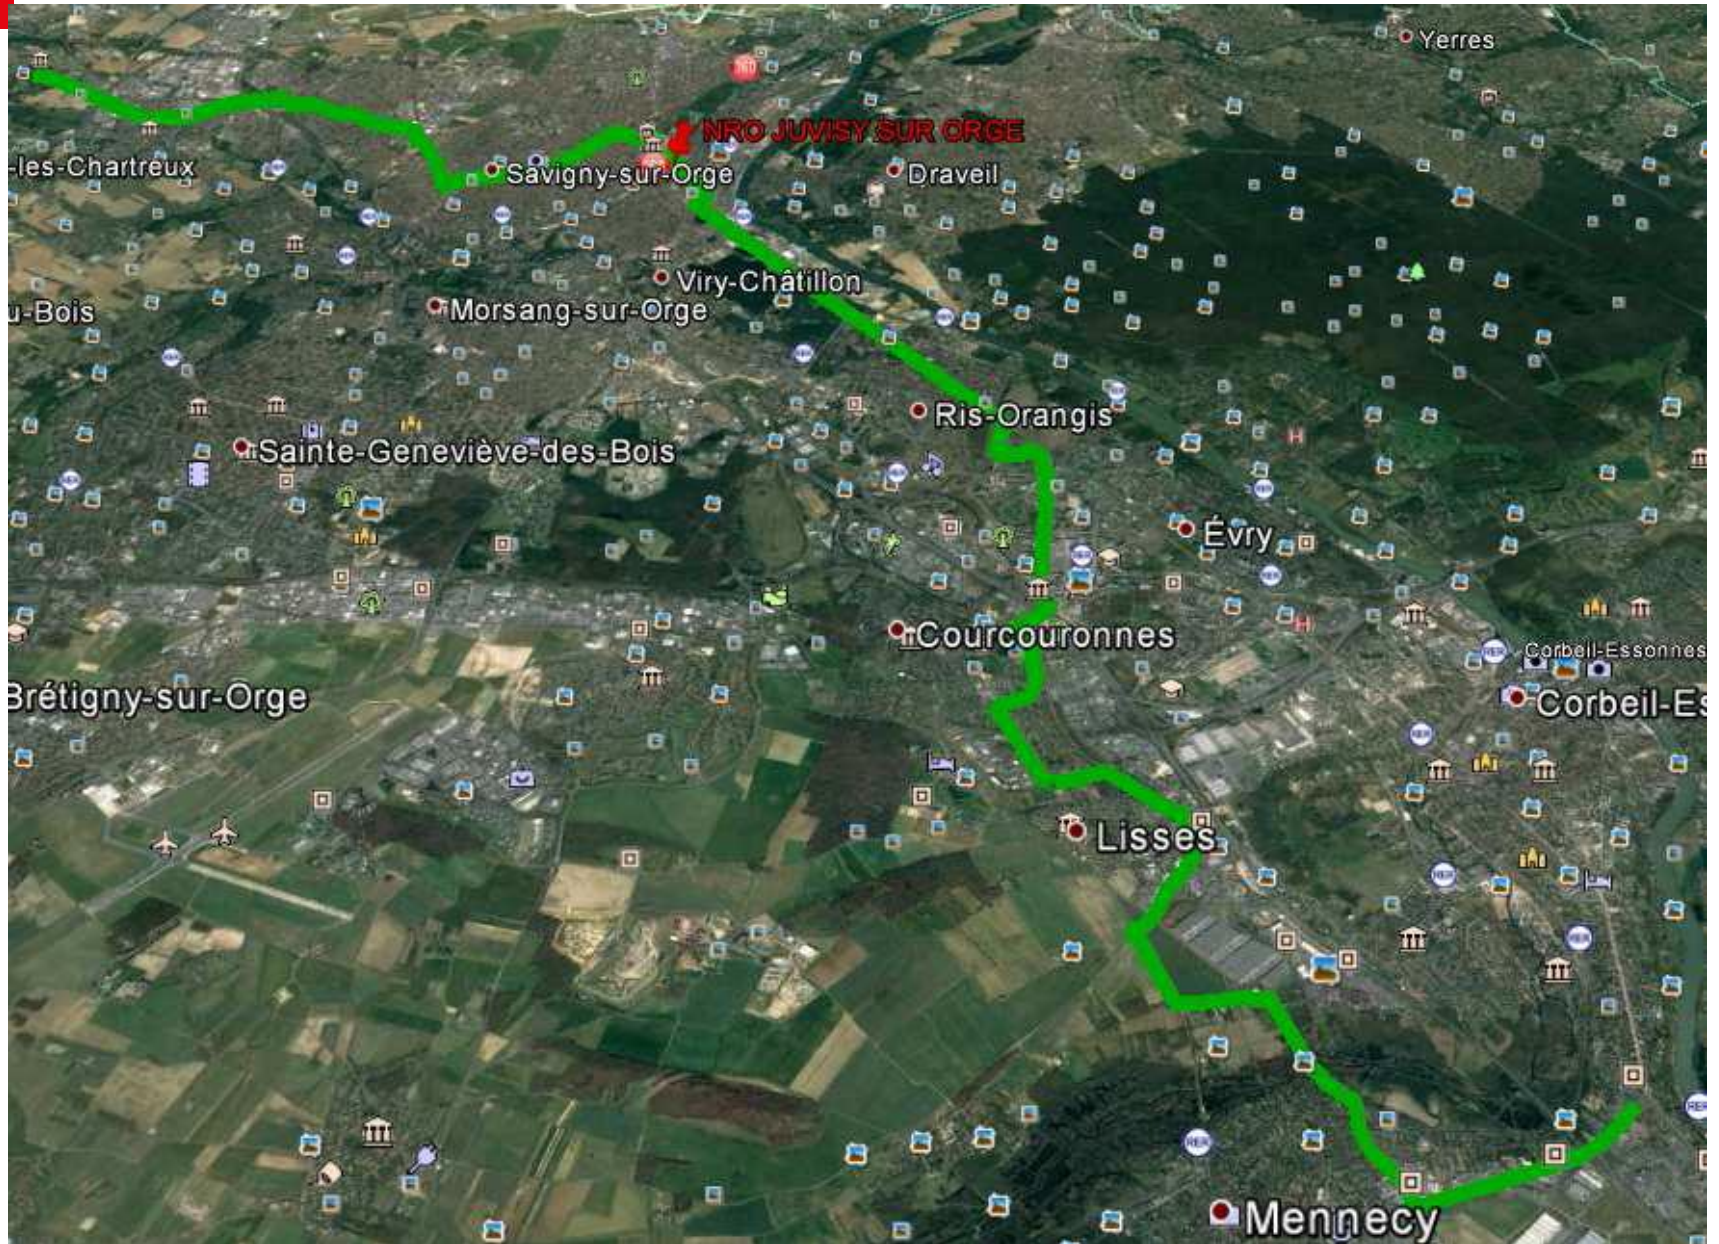

JUVISY SUR ORGE ZMD : architecture souterraine

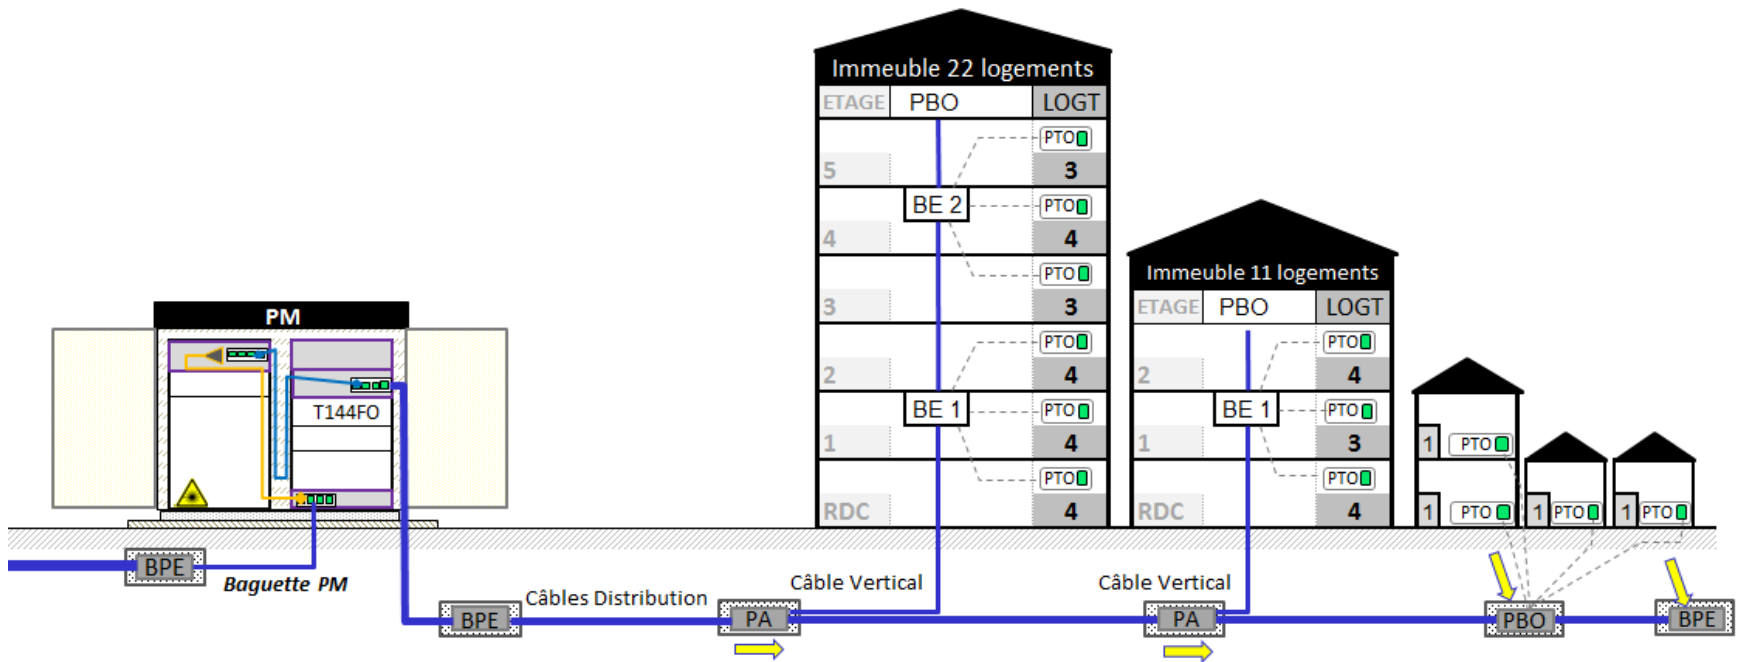


JUVISY SUR ORGE ZMD : architecture aérienne

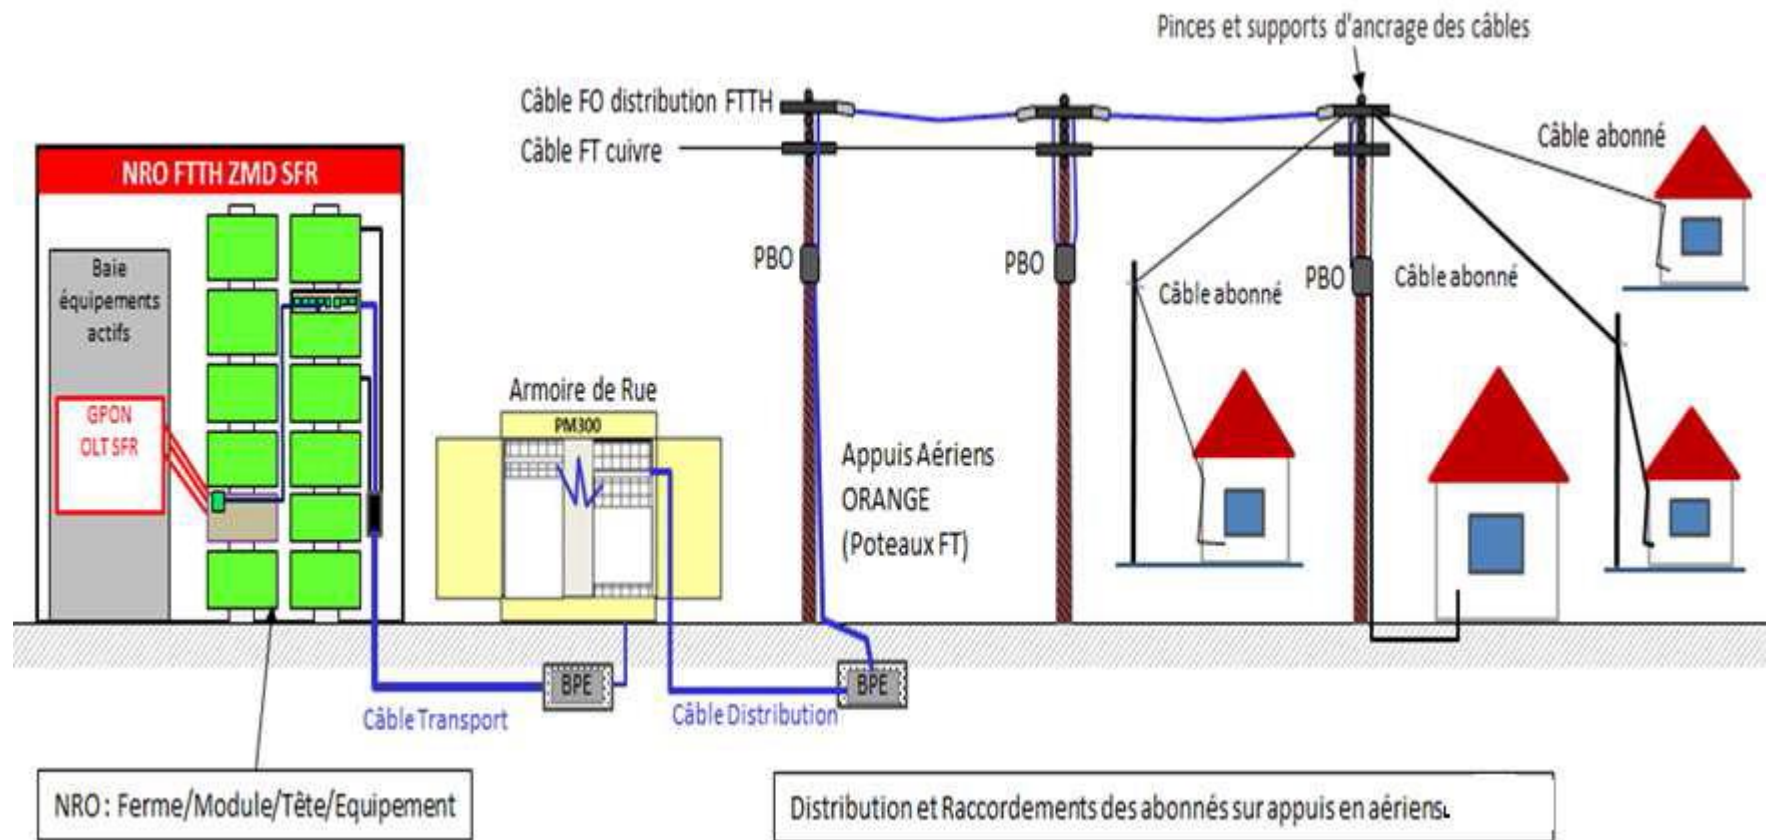

JUVISY SUR ORGE ZMD : Armoire de rue ou Point de Mutualisation (PM)




JUVISY SUR ORGE ZMD : Implantation des armoires de rue ou Point de Mutualisation (PM)

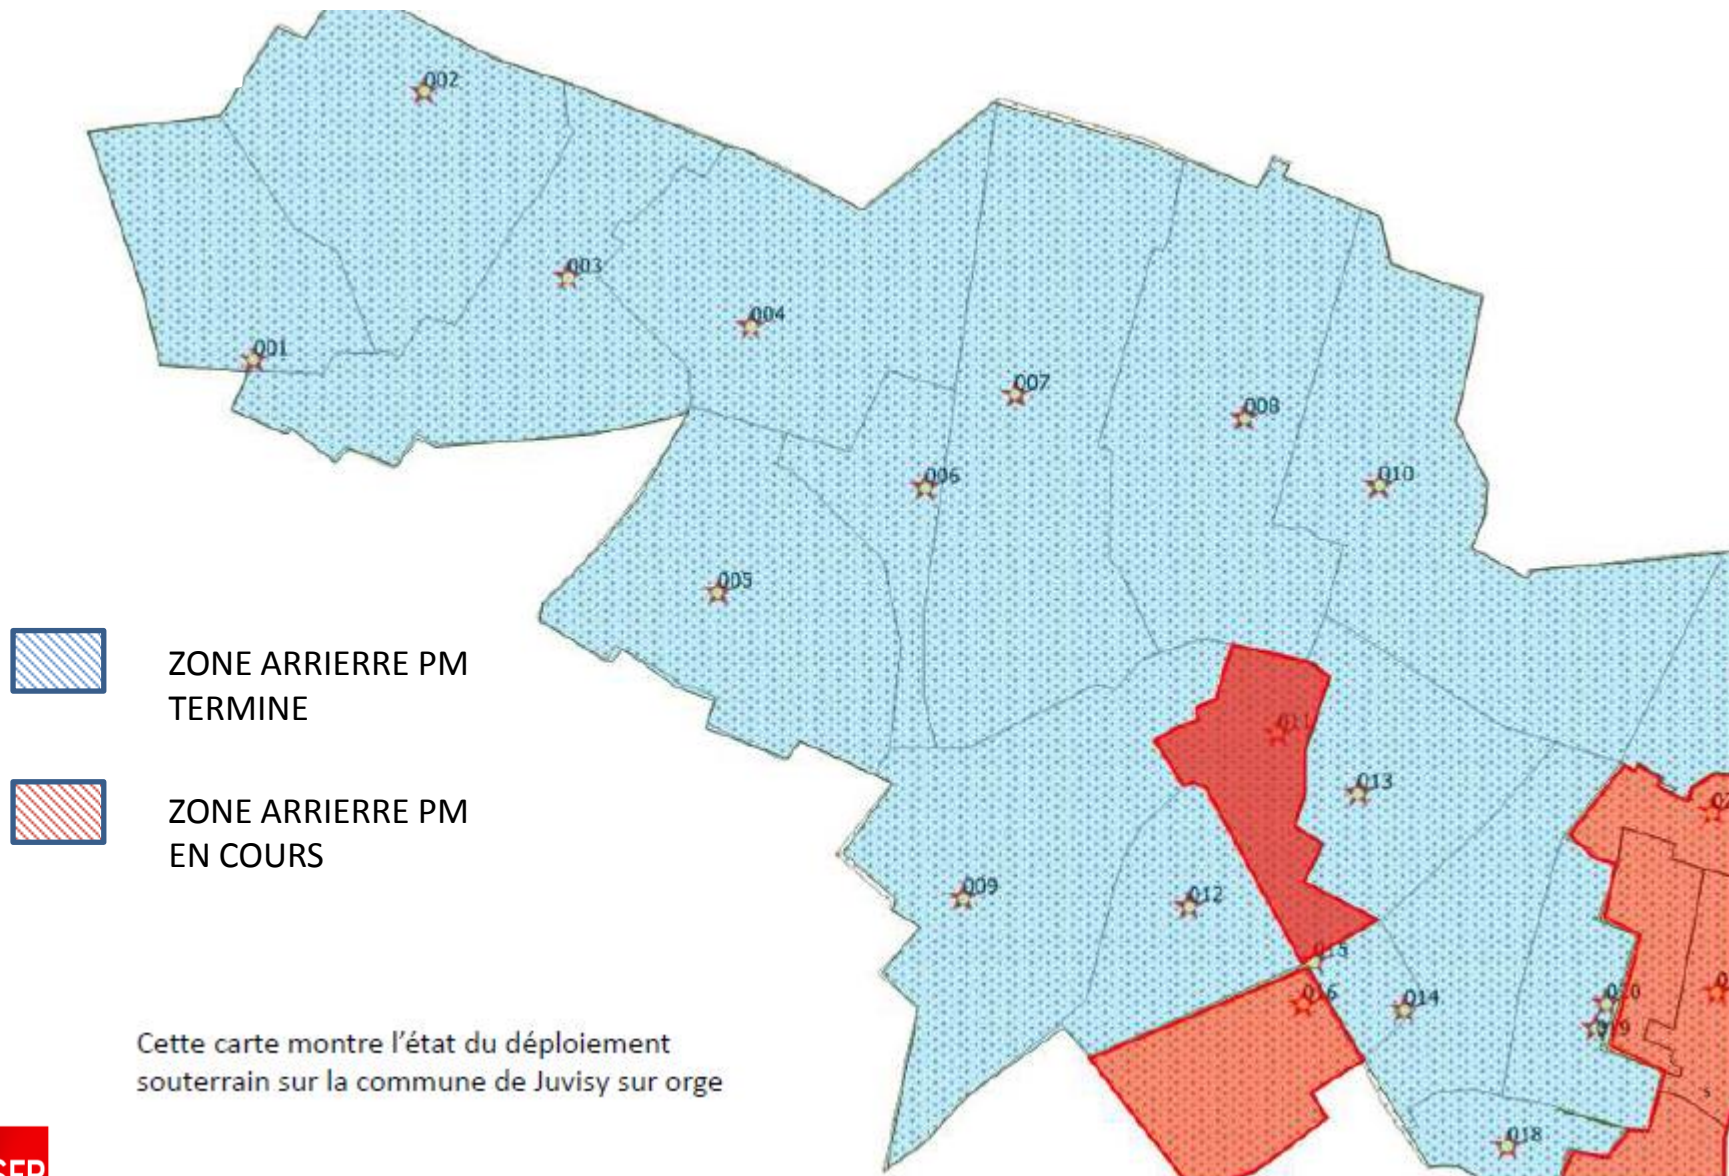

Cette carte montre l'état du déploiement souterrain sur la commune de Juvisy sur orge

JUVISY SUR ORGE ZMD : DECOUPE DES QUARTIERS

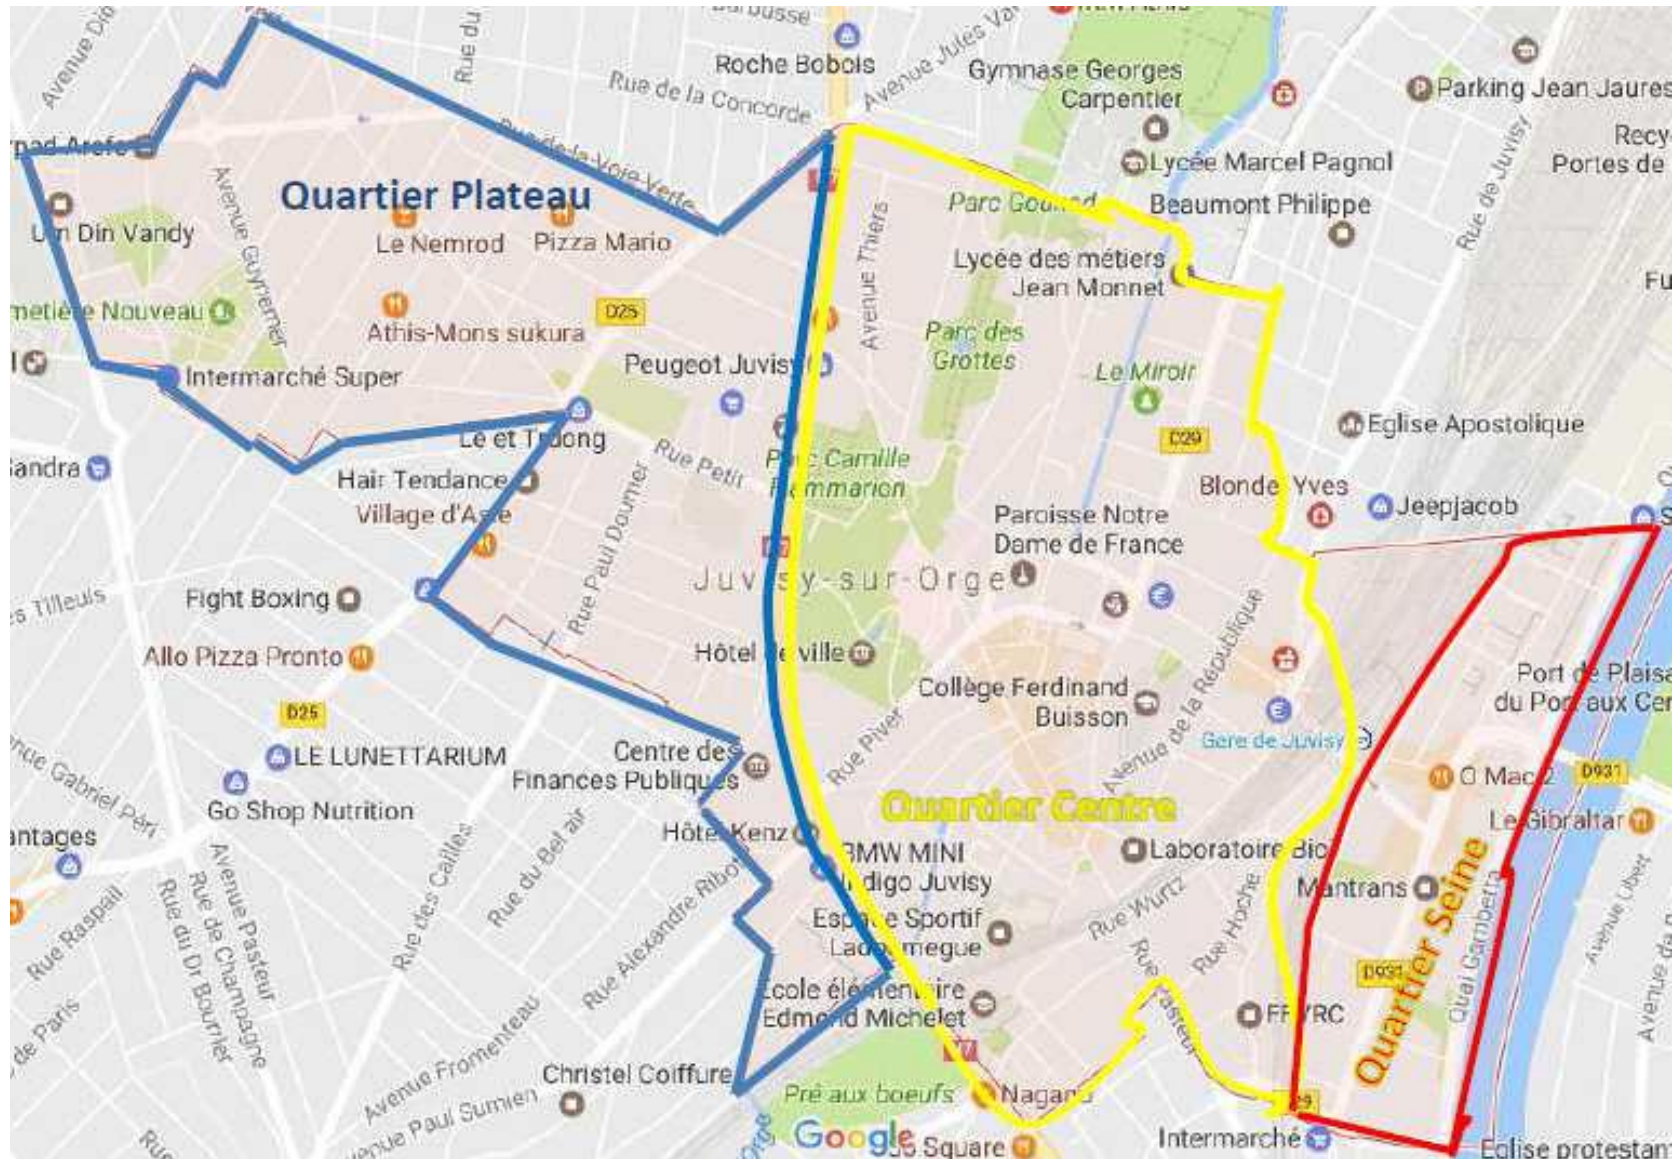

JUVISY SUR ORGE: prévision travaux

Quartier Centre

QUARTIER	PM		NOMBRE DE PRISES				CAPA PM	ZAPM SOUTERRAIN
	N° D'ORDRE	ETAT	COLLECTIFS		PAVILLONS			
			GC FT	AERIEN	GC FT	AERIEN		
PLATEAU	PM001	Posé	373	0	51	0	PM 300	Terminé
PLATEAU	PM002	Posé	128	4	269	49	PM 300	Terminé
PLATEAU	PM003	Posé	181	20	196	48	PM 300	Terminé
PLATEAU	PM004	Posé	72	19	235	44	PM 300	Terminé
PLATEAU	PM005	Posé	97	15	243	63	PM 300	Terminé
PLATEAU	PM006	Posé	281	0	31	6	PM 300	Terminé
PLATEAU	PM009	Posé	185	23	203	31	PM 300	Terminé

L'étude et le déploiement en aérien prendra la suite dès la finalisation du réseau souterrain.

merci
