



**SFR**

**ZMD SFR\_JUVISY SUR ORGE  
ETAT D'AVANCEMENT  
Quartier Plateau**


**PROJET FTTH  
LONG Channara  
Philippe MASSELIS**

# JUVISY SUR ORGE\_ZMD : informations


- Nombre de prises totale sur Juvisy sur Orge : » **9 500**
- Rattaché au NRO de Juvisy sur Orge :
- NRO Juvisy sur Orge : 8 rue Jules Ferry
- Etat : Phase finale
- Ouverture du NRO prévisionnelle : S11\_2017
- Nombre de Point de Mutualisation : 23 sur l'ensemble de la ville
- Prévisionnel de Déploiement :
  - Pose des armoires : 1<sup>er</sup> semestre 2017
    - L'ensemble des Armoires sont posées
      - Dont **7** sur le quartier Plateau
  - Déploiement NRO \_ PM : Boucle de Collecte : en cours de finalisation S10\_2017
  - Déploiement de la Zone arrière :
    - Terminé sur l'ensemble des PM, soit 2 545 prises

**L'étude et le déploiement en aérien prendra la suite dès la finalisation du réseau souterrain.**


# JUVISY SUR ORGE\_ZMD : architecture

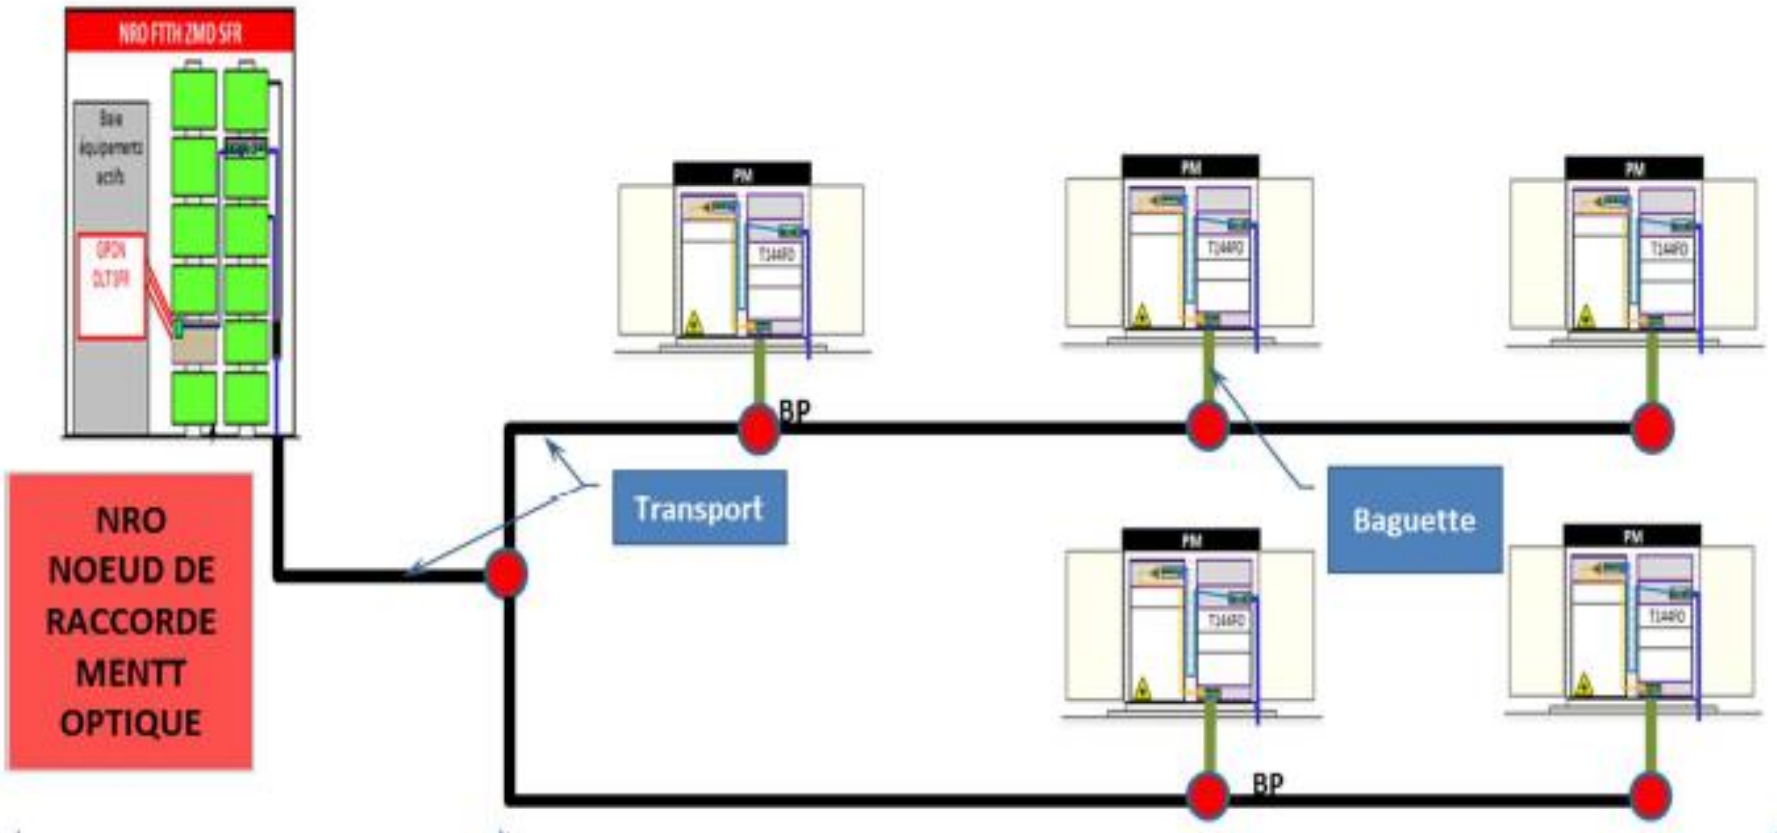


# JUVISY SUR ORGE\_ZMD : architecture du NRO

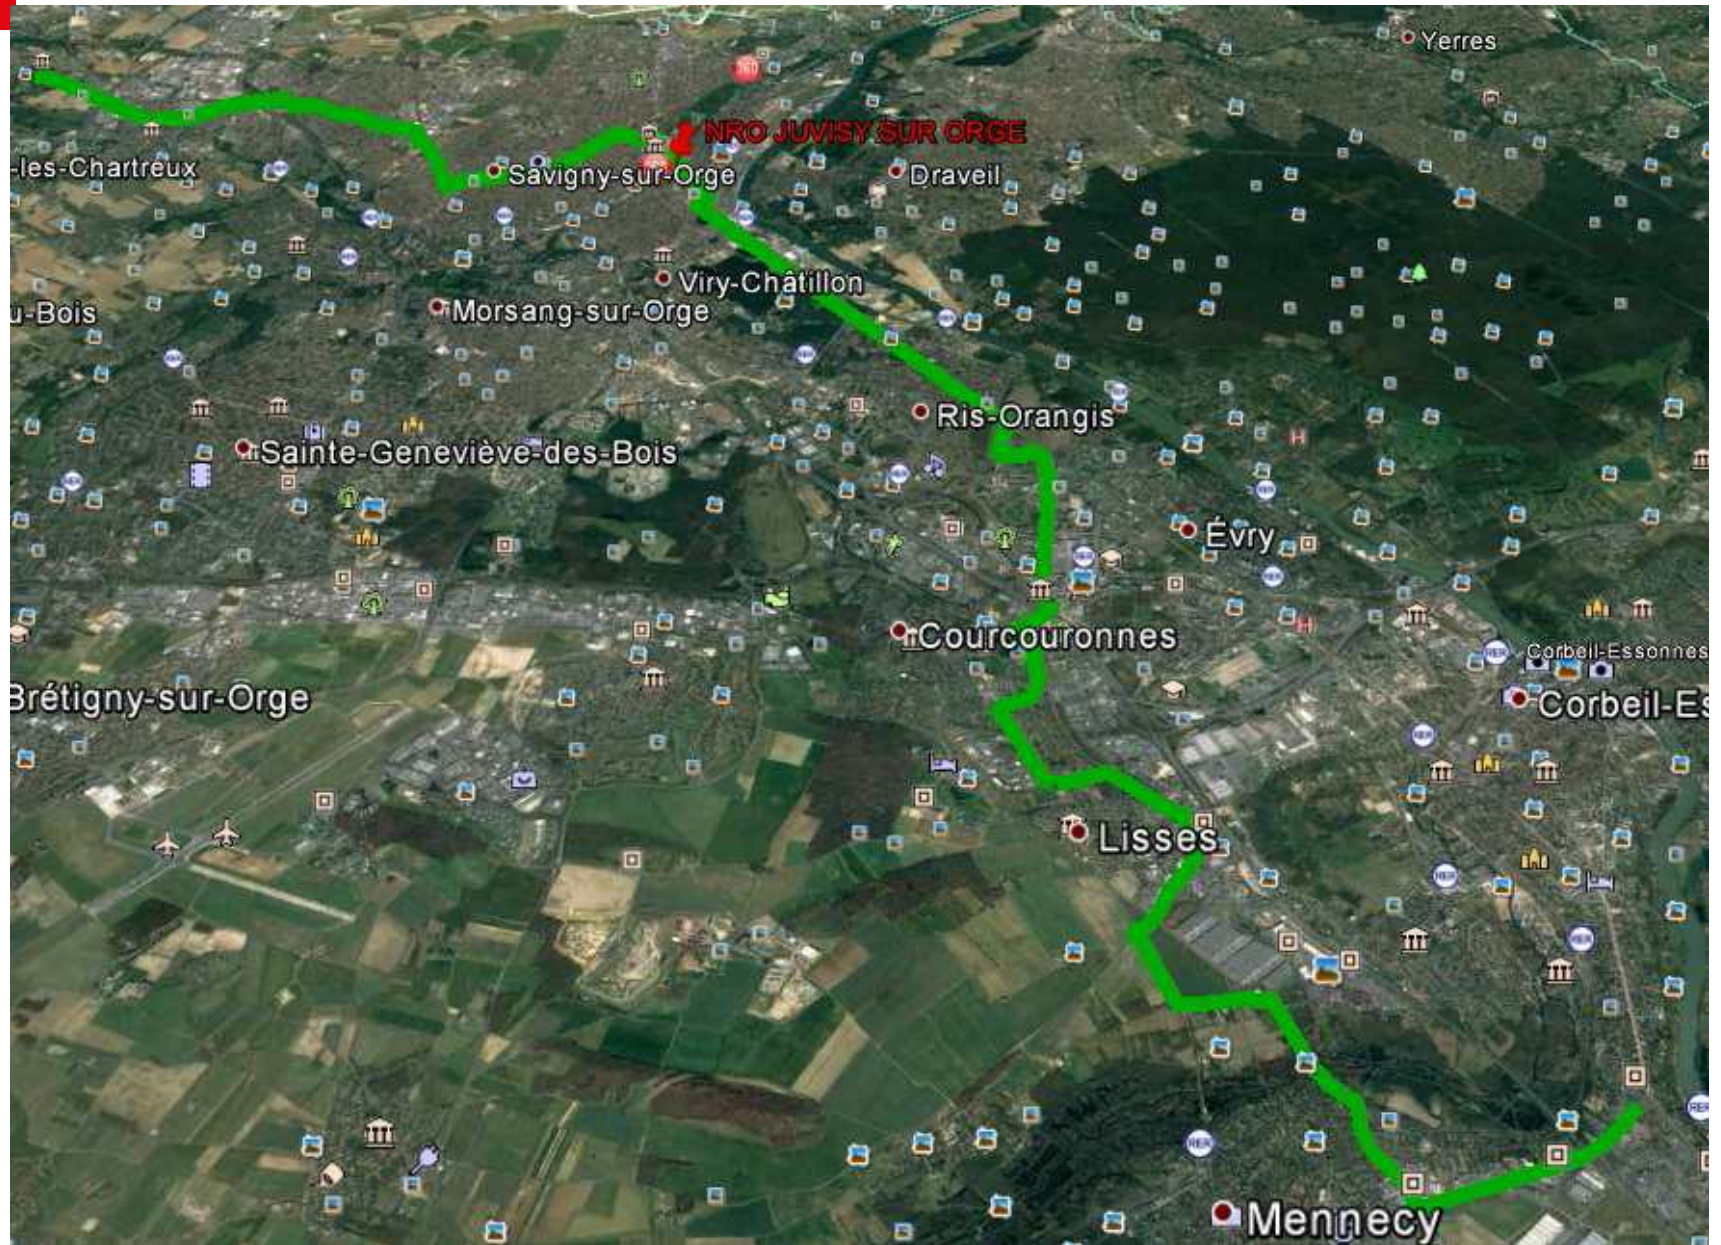

# JUVISY SUR ORGE ZMD : architecture souterraine

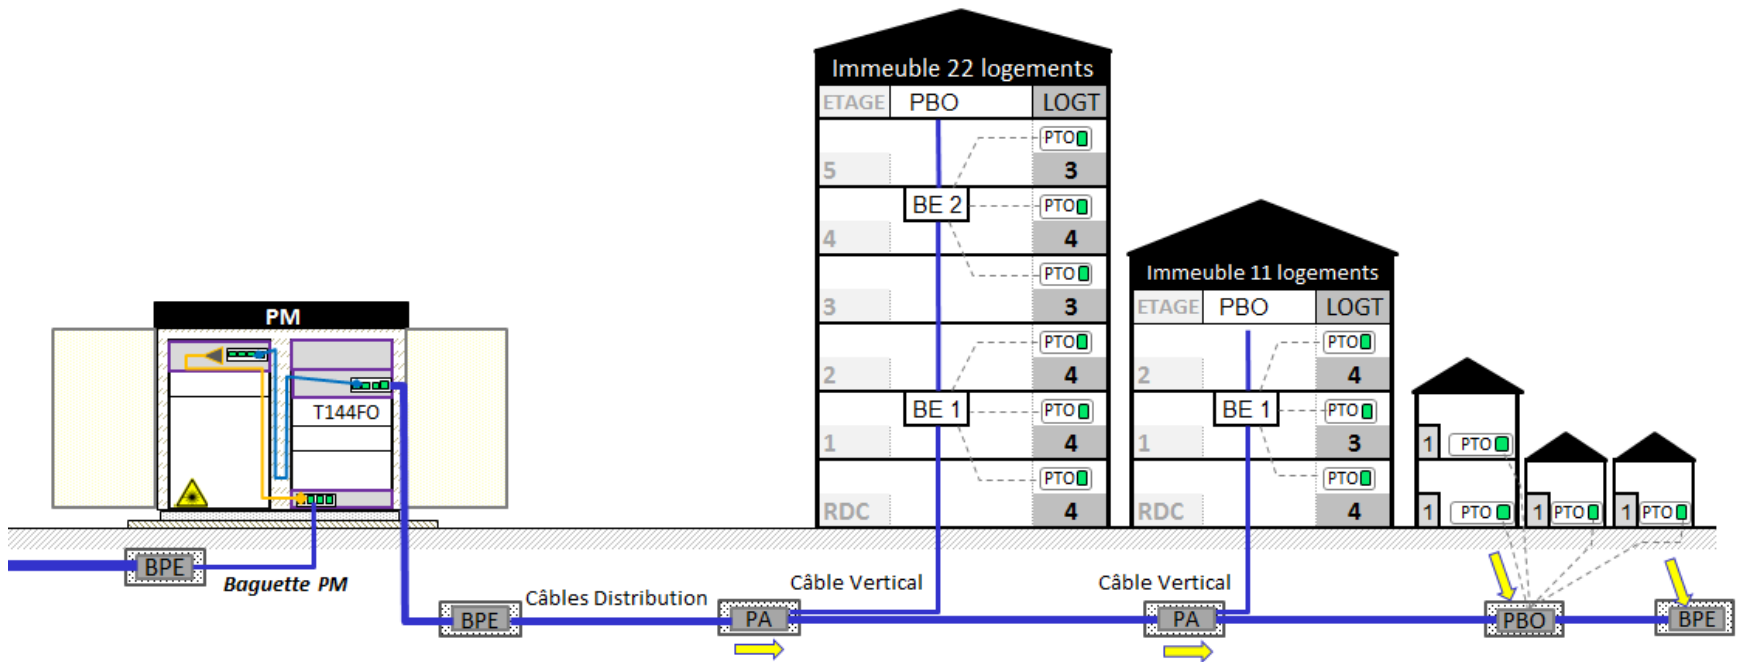


# JUVISY SUR ORGE ZMD : architecture aérienne

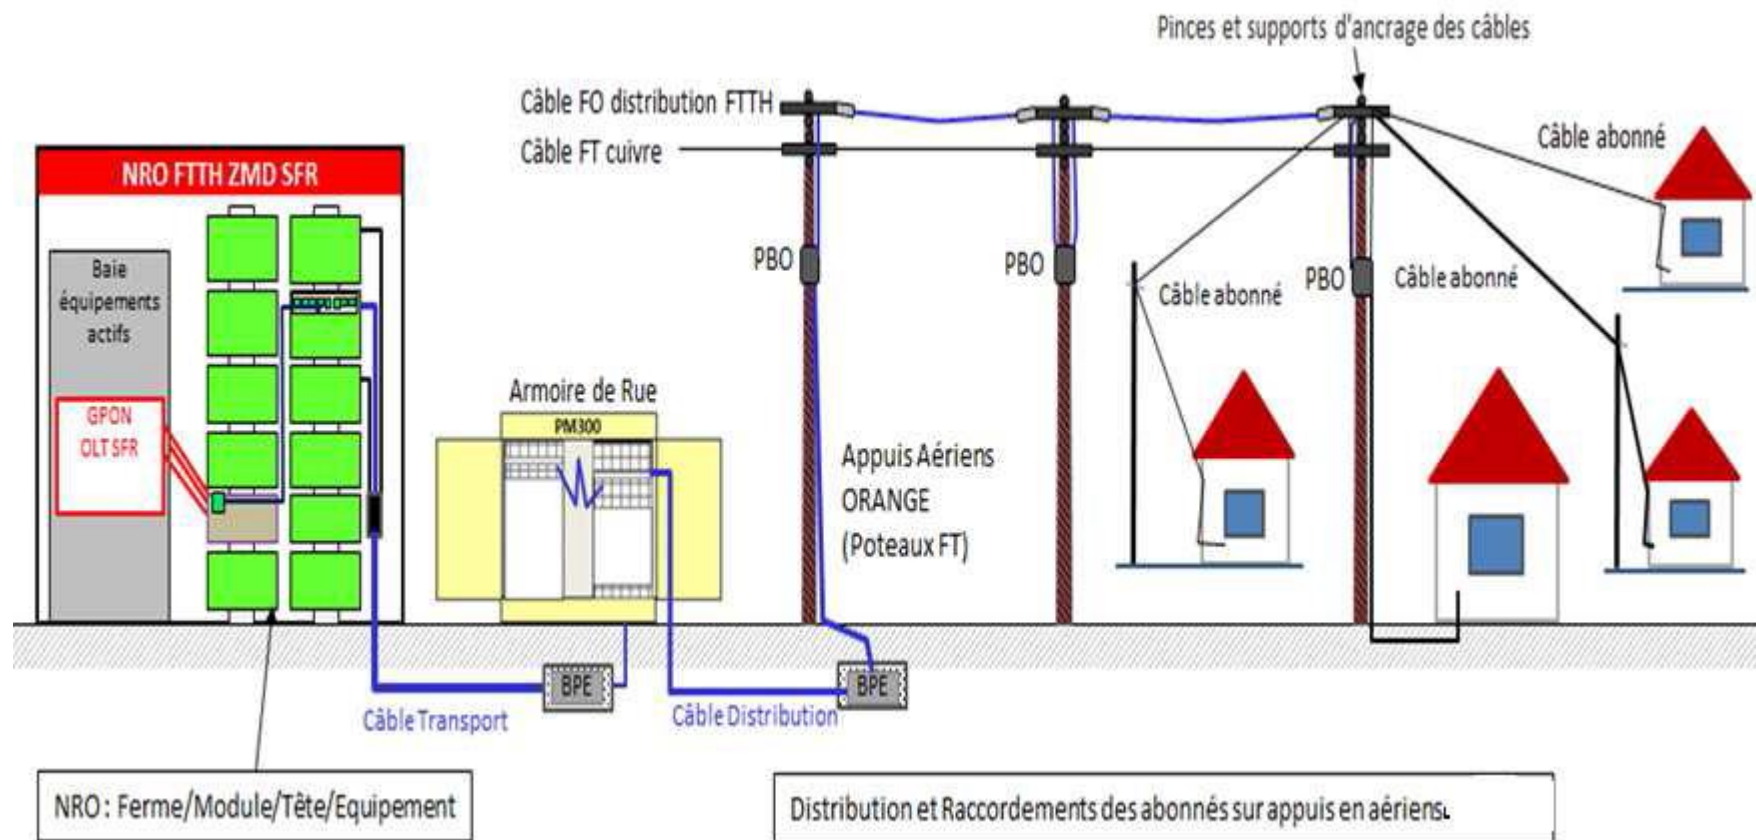

# JUVISY SUR ORGE ZMD : Armoire de rue ou Point de Mutualisation (PM)



# JUVISY SUR ORGE ZMD : Implantation des armoires de rue ou Point de Mutualisation (PM)

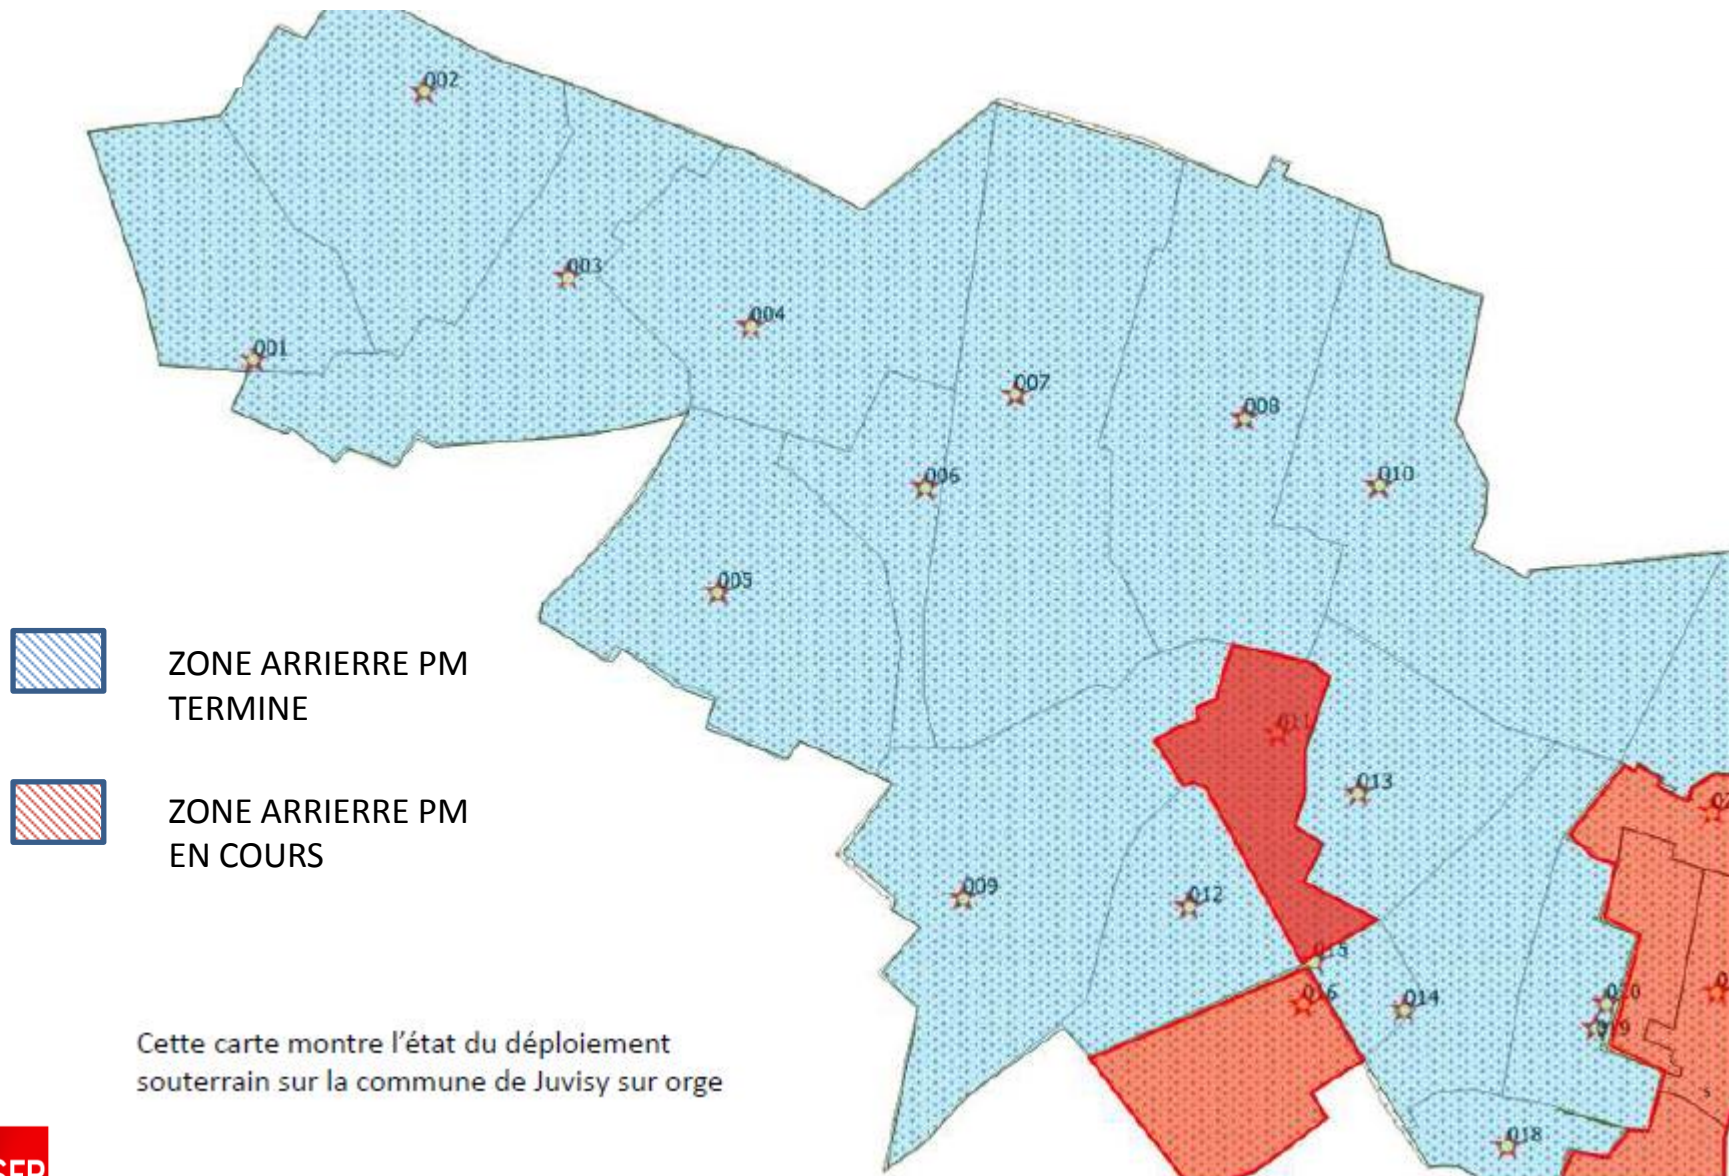

Cette carte montre l'état du déploiement souterrain sur la commune de Juvisy sur orge



# JUVISY SUR ORGE ZMD : DECOUPE DES QUARTIERS



# JUVISY SUR ORGE: prévision travaux

## Quartier Centre

| QUARTIER | PM         |      | NOMBRE DE PRISES |        |           |        | CAPA PM | ZAPM SOUTERRAIN |
|----------|------------|------|------------------|--------|-----------|--------|---------|-----------------|
|          | N° D'ORDRE | ETAT | COLLECTIFS       |        | PAVILLONS |        |         |                 |
|          |            |      | GC FT            | AERIEN | GC FT     | AERIEN |         |                 |
| PLATEAU  | PM001      | Posé | 373              | 0      | 51        | 0      | PM 300  | Terminé         |
| PLATEAU  | PM002      | Posé | 128              | 4      | 269       | 49     | PM 300  | Terminé         |
| PLATEAU  | PM003      | Posé | 181              | 20     | 196       | 48     | PM 300  | Terminé         |
| PLATEAU  | PM004      | Posé | 72               | 19     | 235       | 44     | PM 300  | Terminé         |
| PLATEAU  | PM005      | Posé | 97               | 15     | 243       | 63     | PM 300  | Terminé         |
| PLATEAU  | PM006      | Posé | 281              | 0      | 31        | 6      | PM 300  | Terminé         |
| PLATEAU  | PM009      | Posé | 185              | 23     | 203       | 31     | PM 300  | Terminé         |

L'étude et le déploiement en aérien prendra la suite dès la finalisation du réseau souterrain.

merci
