



ZMD SFR_JUVISY SUR ORGE
ETAT D'AVANCEMENT
Quartier SEINE


PROJET FTTH
LONG Channara
Philippe MASSELIS

JUVISY SUR ORGE_ZMD : informations


- Nombre de prises totale sur Juvisy sur Orge : » **9 500**
- Rattaché au NRO de Juvisy sur Orge :
 - NRO Juvisy sur Orge : 8 rue Jules Ferry
 - Etat : Phase finale
 - Ouverture du NRO prévisionnelle : S11_2017
- Nombre de Point de Mutualisation : 23 sur l'ensemble de la ville
- Prévisionnel de Déploiement :
 - Pose des armoires : 1^{er} semestre 2017
 - L'ensemble des Armoires sont posées
 - Dont **6** sur le quartier Seine
 - Déploiement NRO _ PM : Boucle de Collecte : en cours de finalisation S10_2017
 - Déploiement de la Zone arrière :
 - Terminé sur l'ensemble des PM, soit 1 138 prises
 - En cours de déploiement sur 3 PM soit 1 223 prises

L'étude et le déploiement en aérien prendra la suite dès la finalisation du réseau souterrain.


JUVISY SUR ORGE_ZMD : architecture

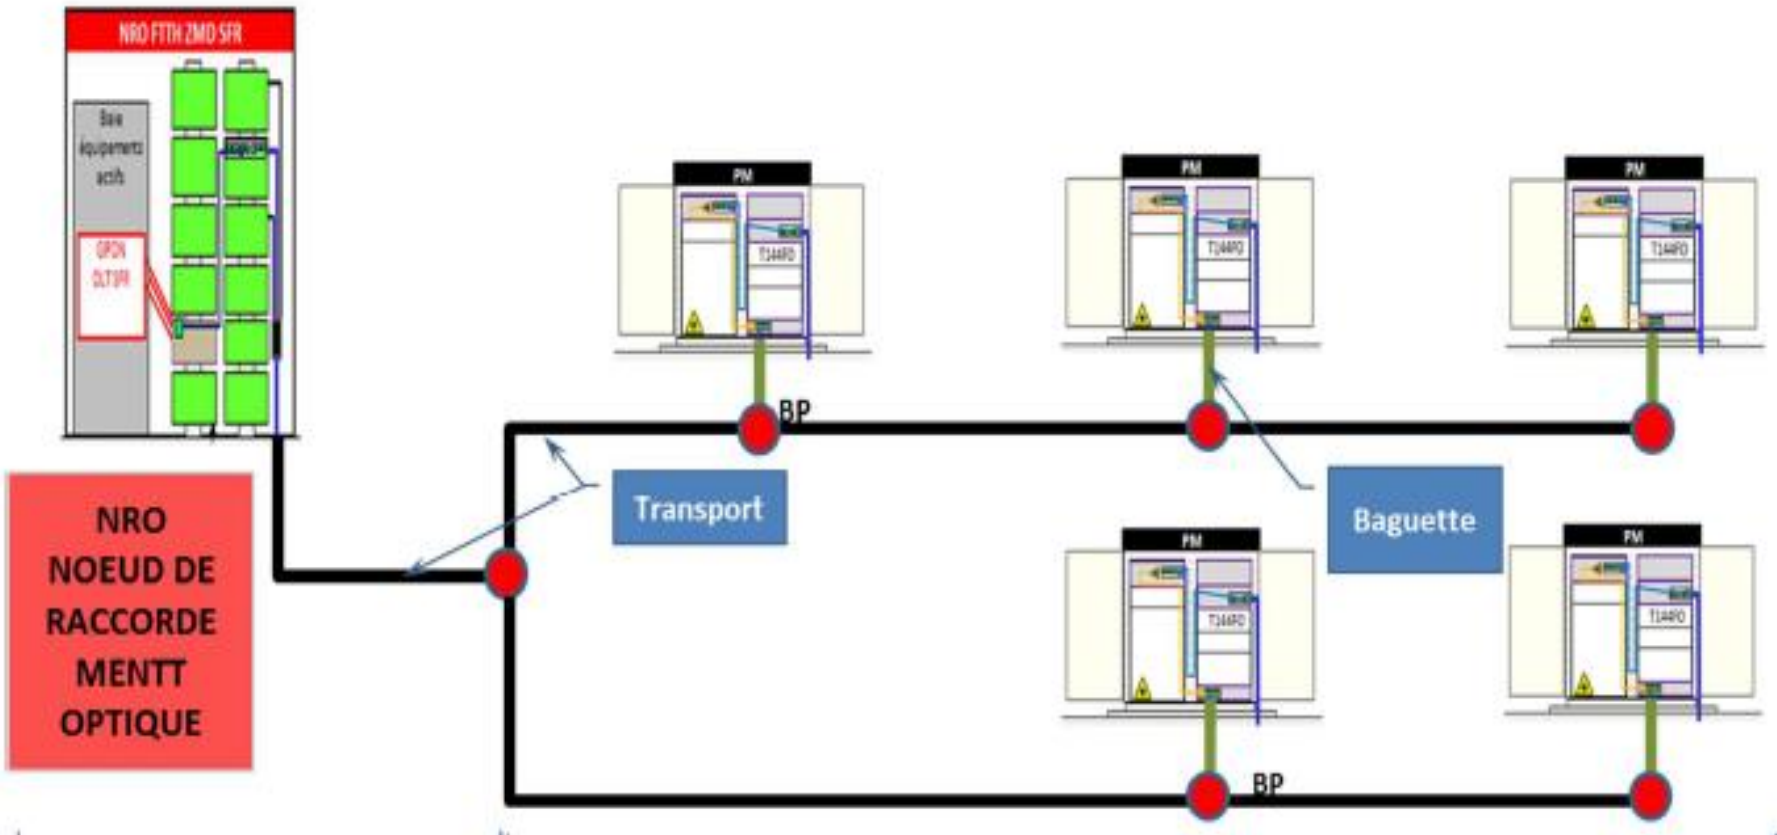

JUVISY SUR ORGE_ZMD : architecture du NRO

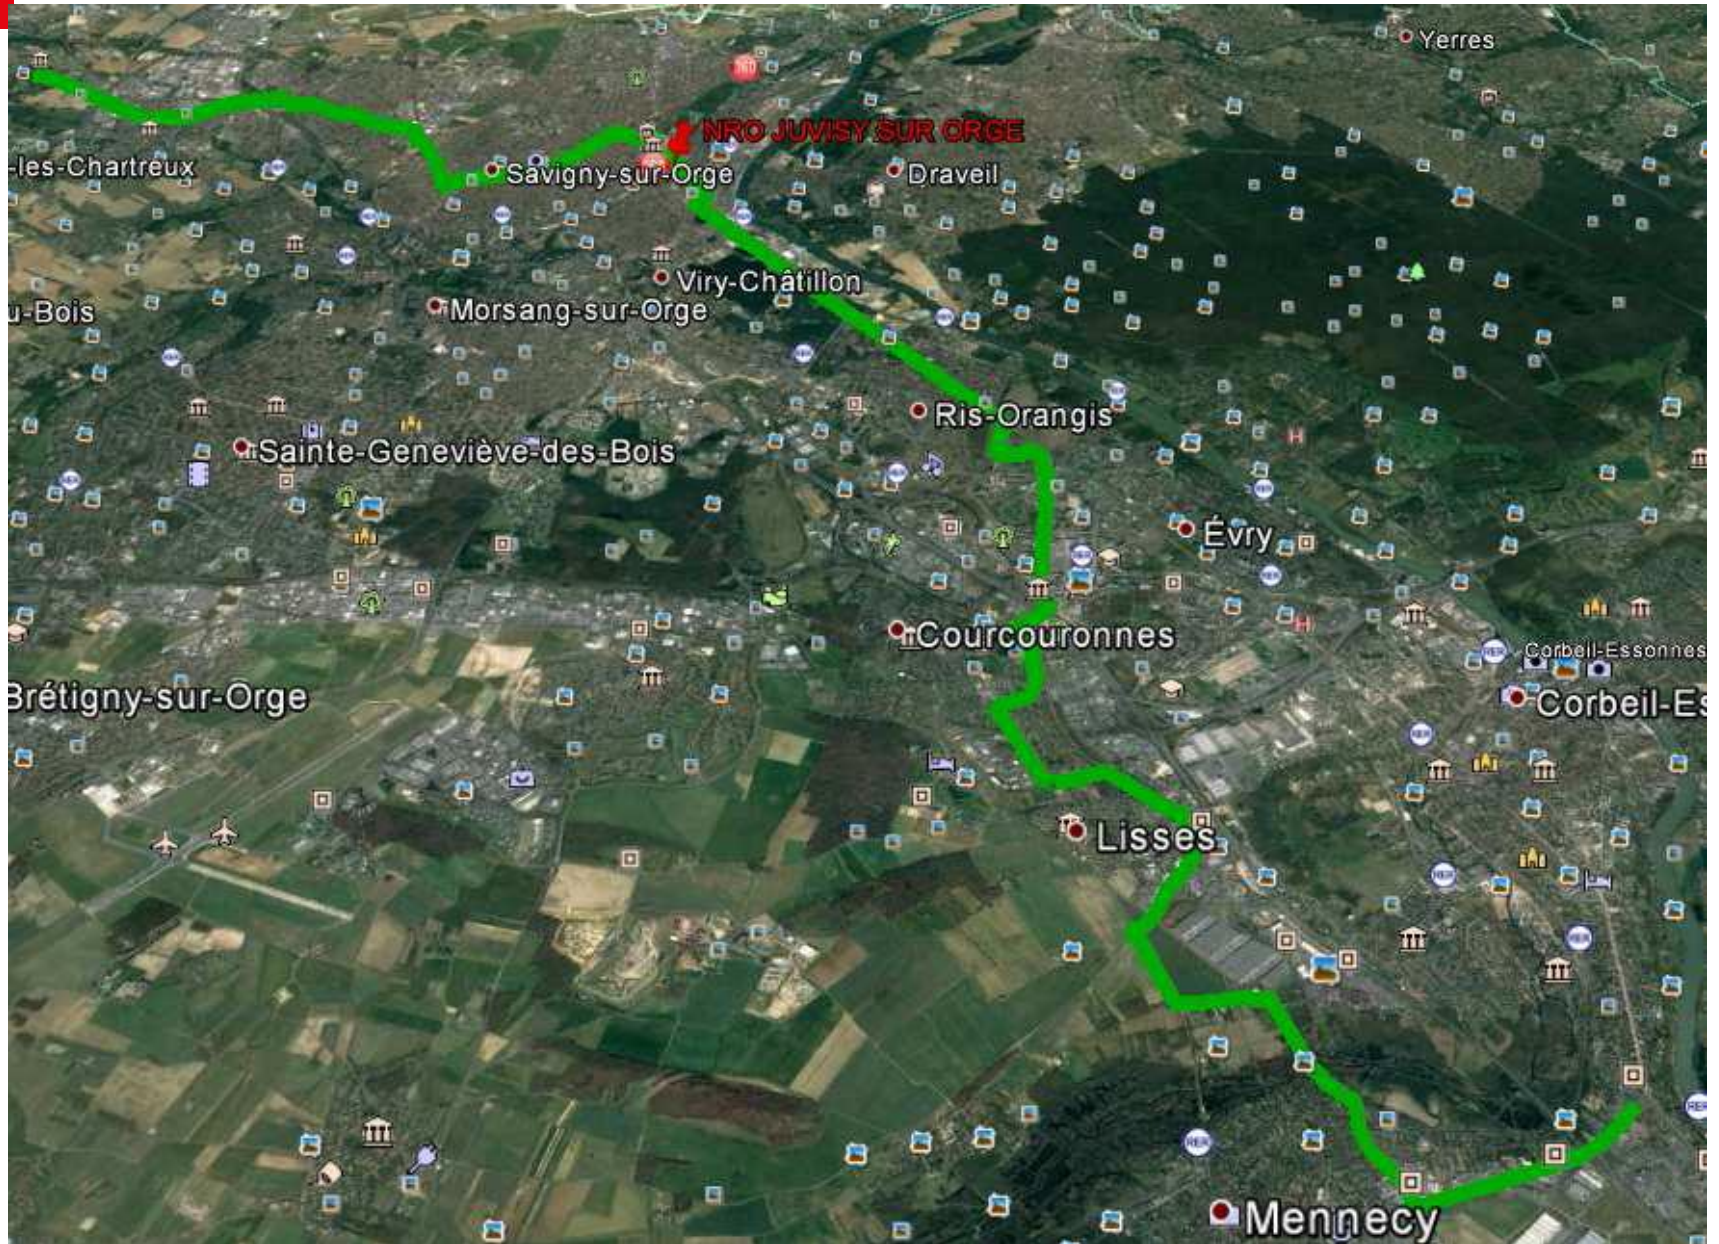


JUVISY SUR ORGE ZMD : architecture souterraine

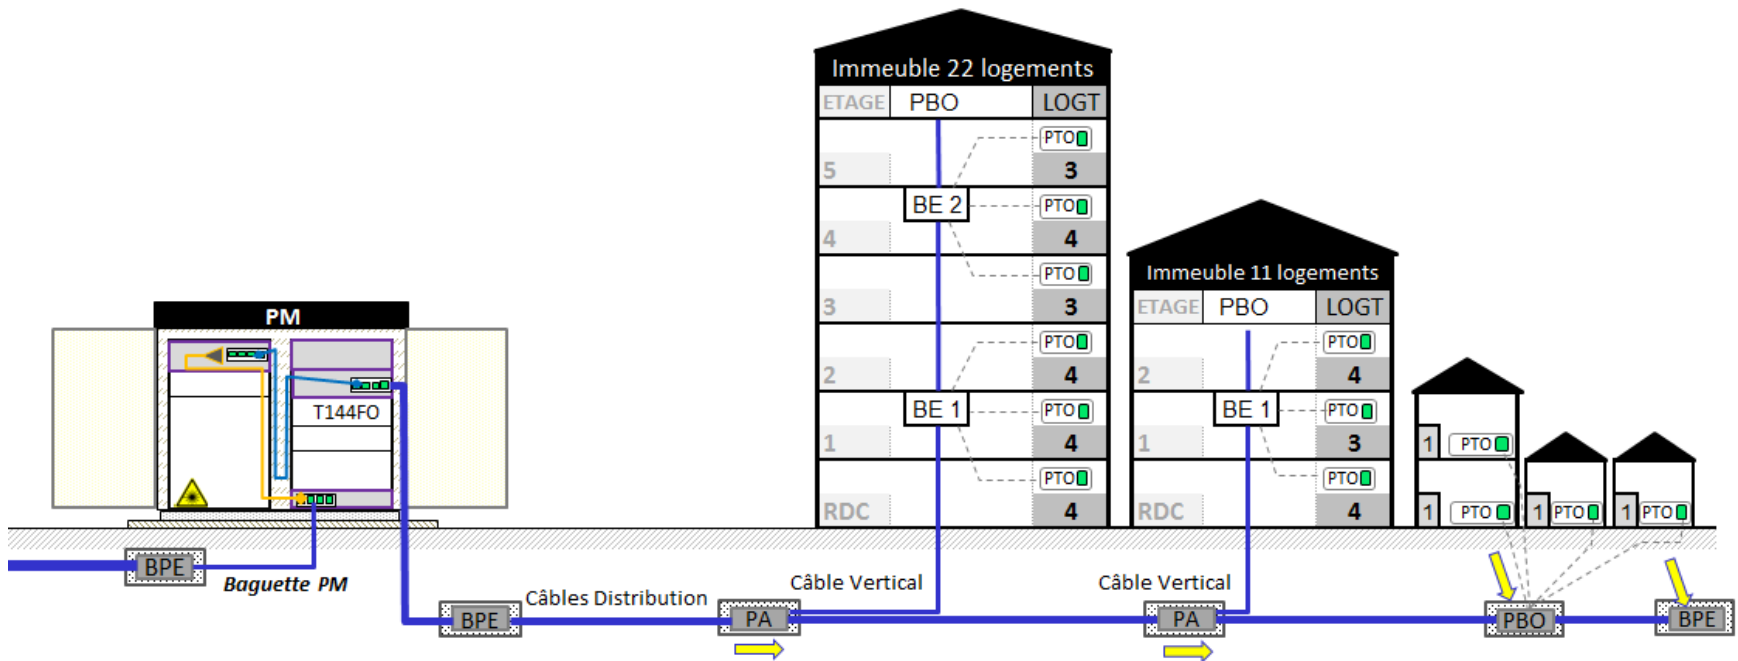


JUVISY SUR ORGE ZMD : Armoire de rue ou Point de Mutualisation (PM)



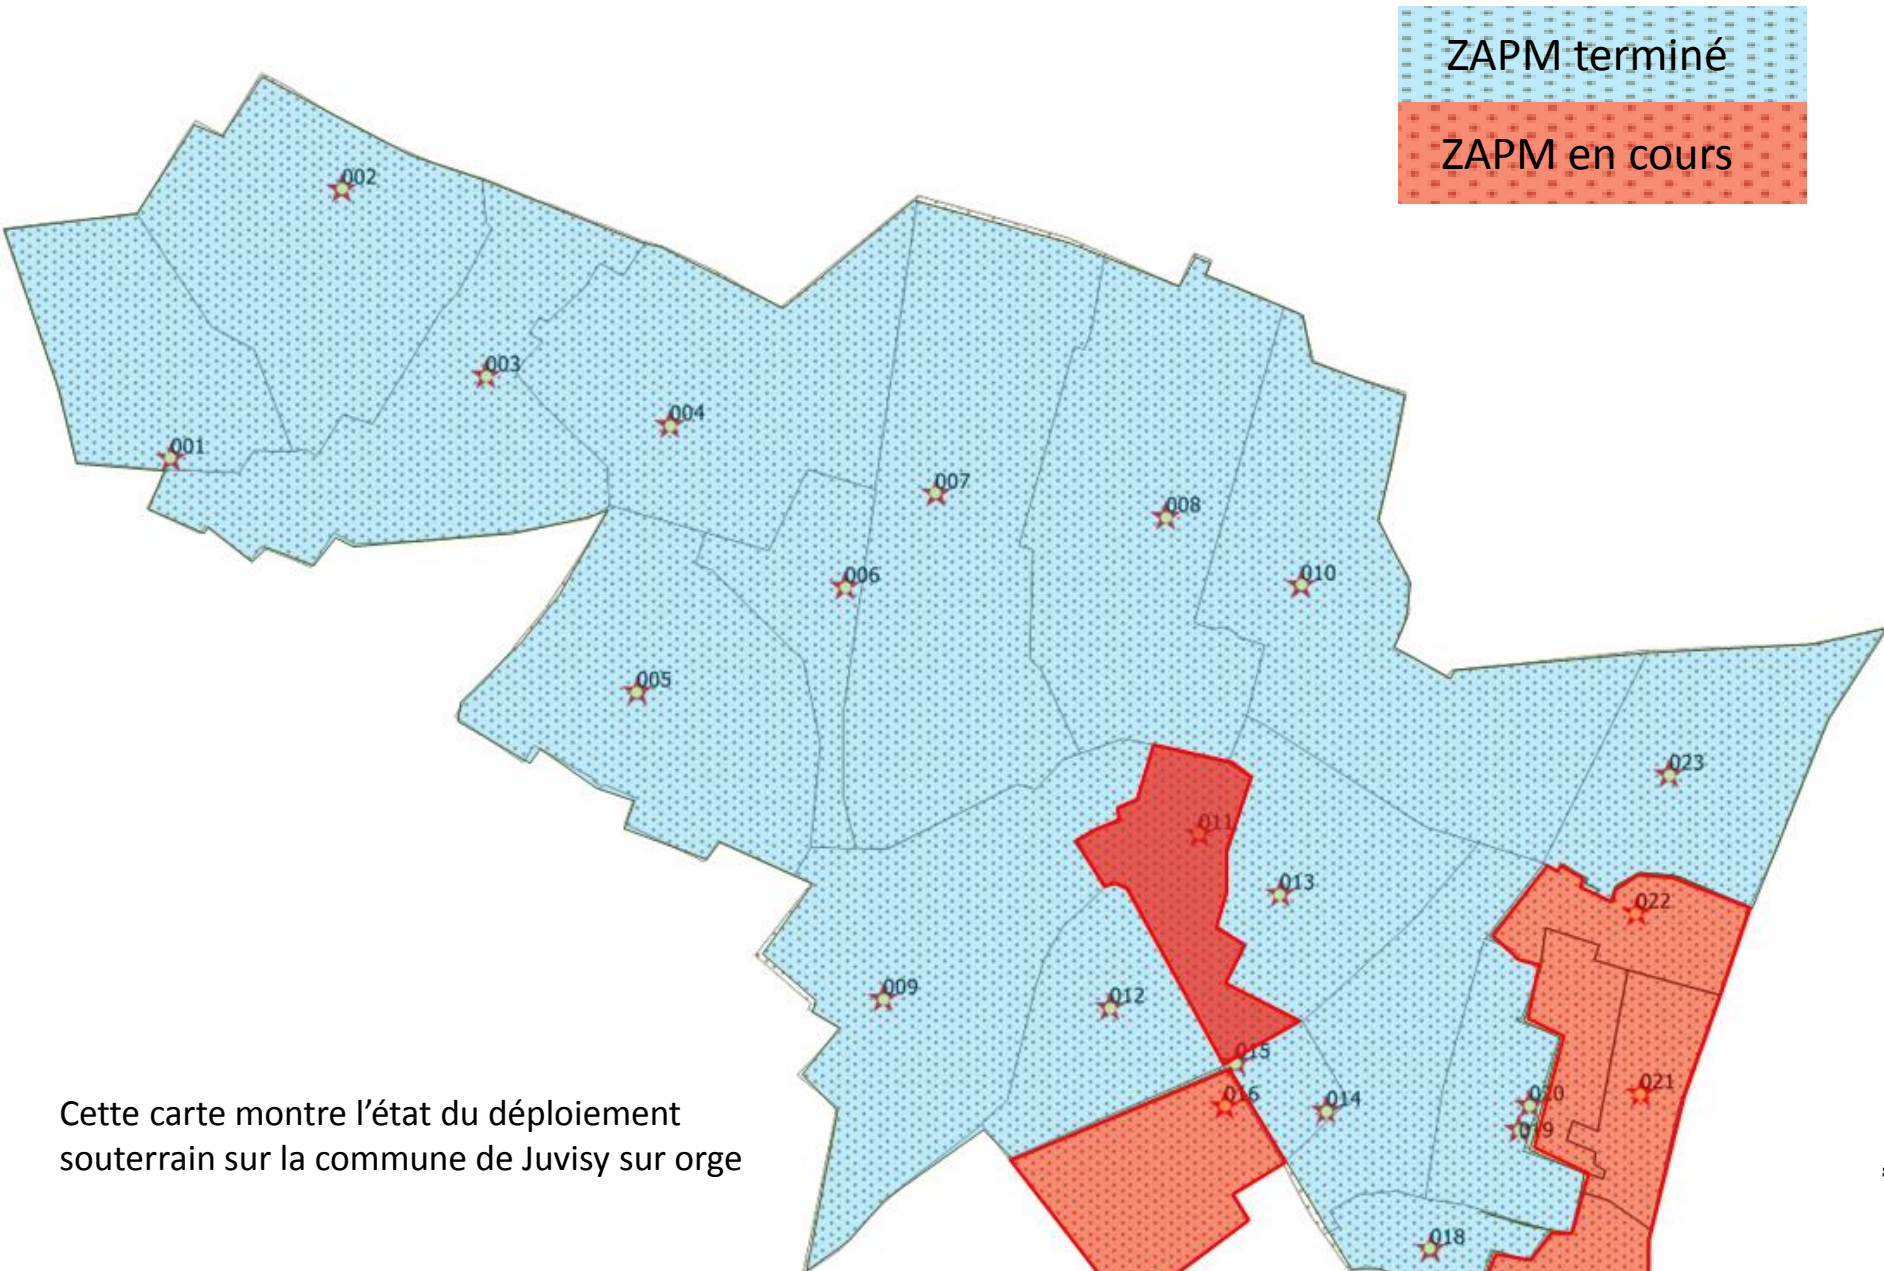

JUVISY SUR ORGE ZMD : DECOUPE DES QUARTIERS

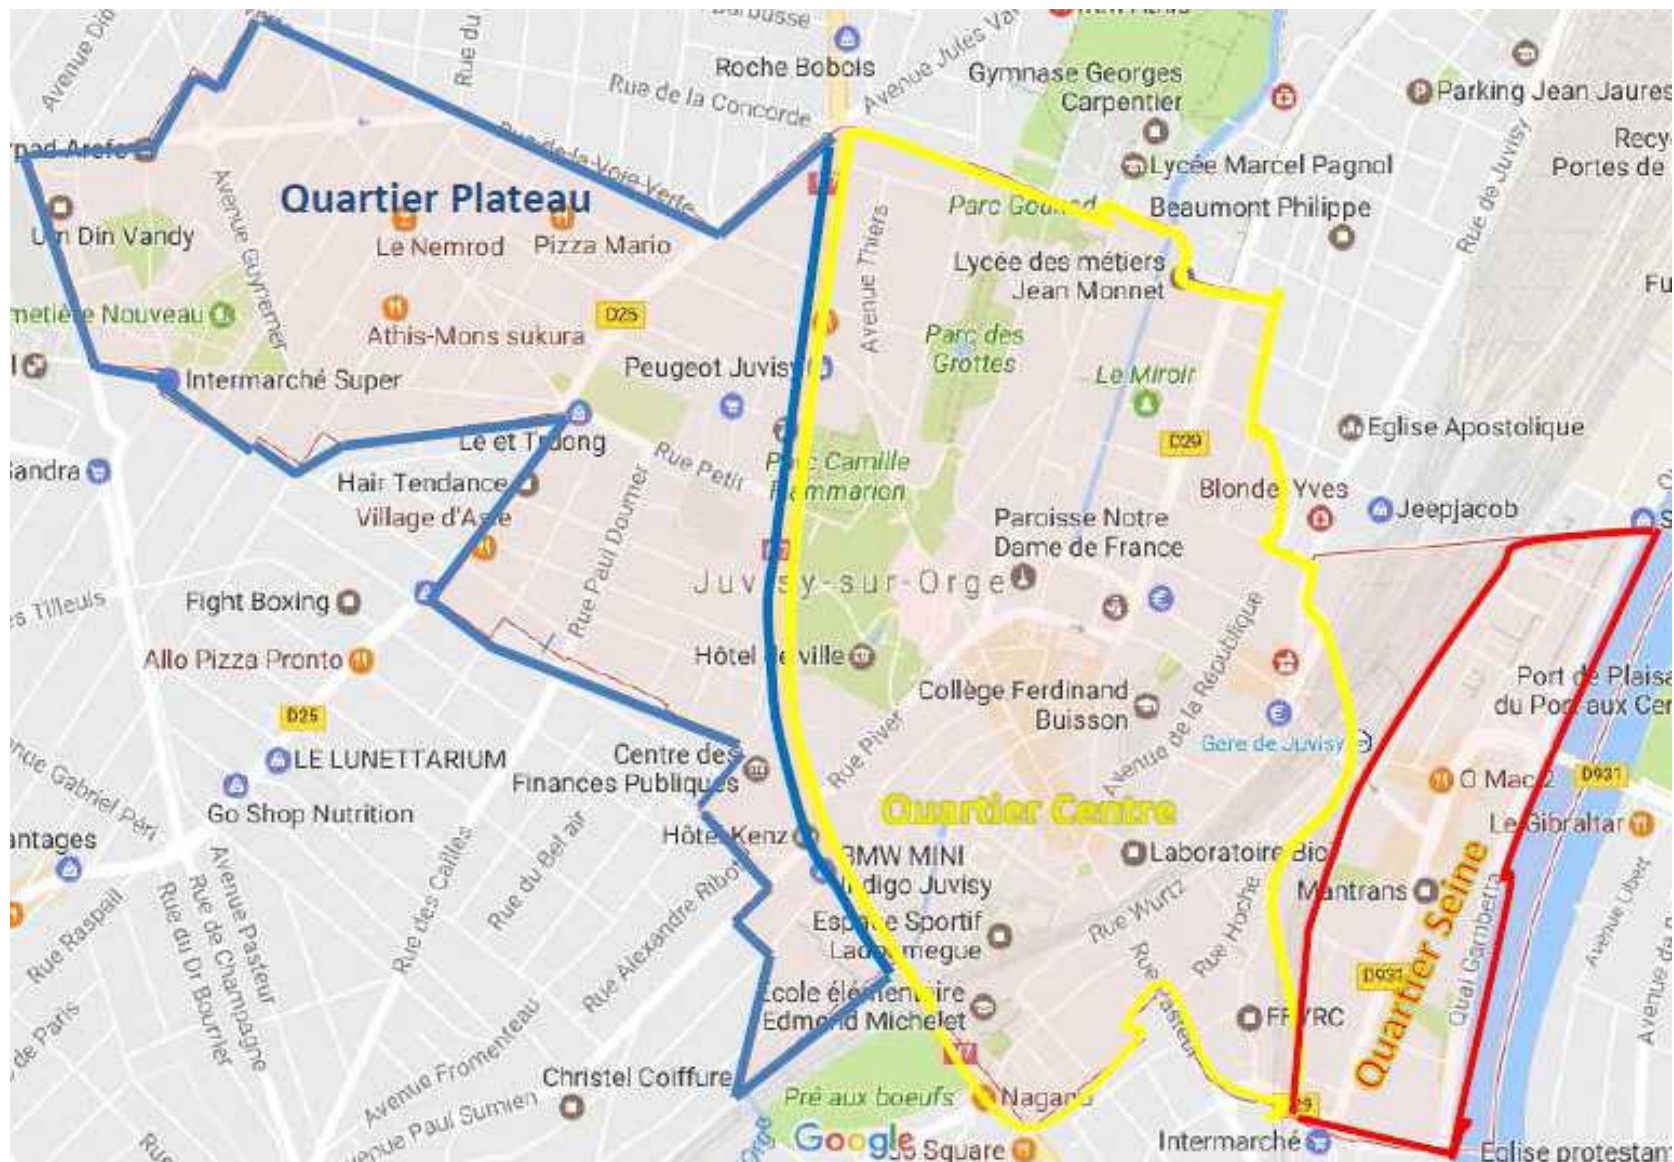

JUVISY SUR ORGE: prévision travaux

Quartier Seine

QUARTIER	PM		NOMBRE DE PRISES				CAPA PM	ZAPM SOUTERRAIN
	N° D'ORDRE	ETAT	COLLECTIFS		PAVILLONS			
			GC FT	AERIEN	GC FT	AERIEN		
SEINE	PM018	Posé	301	0	15	4	PM 300	Terminé
SEINE	PM019	Posé	345	19	50	5	PM 300	Terminé
SEINE	PM020	Posé	412	0	3	0	PM 300	En cours
SEINE	PM021	Posé	417	12	2	0	PM 300	En cours
SEINE	PM022	Posé	378	42	11	16	PM 300	En cours
SEINE	PM023	Posé	362	24	65	1	PM 300	Terminé

L'étude et le déploiement des 123 prises en aérien prendra la suite dès la finalisation du réseau souterrain.

merci
